

PROJEKTPLAN

Workflowbasierte Rückbestätigung
von Lieferterminen

Projektarbeit

MINOVA / THWS

12. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Projektziel	2
3	Projektphasen und Meilensteine	2
4	Meilensteine	3
5	Zeitplan	3
6	Systemarchitektur	3
7	Technologien	4
8	Rollen	4
9	Qualitätssicherung	4
10	Akzeptanzkriterien	5
11	Erwartetes Ergebnis	5

1 Einleitung

Im aktuellen DISPO-Prozess werden Liefertermine bzw. Lieferoptionen manuell mit Kunden abgestimmt. Dieser Ablauf ist zeitintensiv, fehleranfällig und bei steigender Auftragszahl schwer skalierbar.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines prototypischen Systems zur workflowbasierten Rückbestätigung von Lieferterminen. Das System unterstützt die Disposition bei der strukturierten Einholung und Verarbeitung von Kundenrückmeldungen zu vorgeschlagenen Lieferoptionen.

Die Prozesslogik wird mithilfe von BPMN 2.0 modelliert und durch die Workflow-Engine Camunda ausgeführt.

2 Projektziel

Das Projekt verfolgt folgende Ziele:

- Erfassung und Anzeige relevanter Bestell- und Auftragsdaten
- Darstellung von durch die Disposition vorgeschlagenen Lieferoptionen
- Digitale Kommunikation mit Kunden
- Verarbeitung von Kundenreaktionen wie Bestätigung, Ablehnung oder ausbleibende Antwort
- Workflowgesteuerte Prozessausführung mit Camunda
- Übergabe bestätigter Aufträge an die Disposition
- Verbesserung der Transparenz und Nachverfolgbarkeit

3 Projektphasen und Meilensteine

Phase	Beschreibung	Zeitraum	Meilenstein
P1: Projektdefinition und Analyse	Projektidee abstimmen, Anforderungen analysieren und Projektumfang definieren	28.04–04.05	M1
P2: Planung und Grundstruktur des Systems	Lastenheft, Pflichtenheft und Projektplan erstellen sowie erste Backend- und Frontendstruktur aufsetzen	05.05–11.05	M2
P3: Architektur und Schnittstellen	Systemarchitektur, DISPO-Schnittstelle, Datenmodell und Backend-Grundstruktur definieren	12.05–25.05	M3
P4: Weiterentwicklung von Backend und Workflow	Backend, Frontend und Camunda-Workflow funktional erweitern	26.05–22.06	M4

P5: End-to-End-Prozess	Durchgängigen Prozess von Auftrag über Kundenrückmeldung bis Statusänderung umsetzen	23.06–06.07	M5
P6: Testphase und Fehlerbehebung	Systemtests durchführen, Fehler identifizieren und beheben	07.07–20.07	M6
P7: Finalisierung des Prototyps	Prototyp stabilisieren, Demo vorbereiten und finale Anpassungen durchführen	21.07–03.08	M7
P8: Dokumentation und Präsentation	Projektdokumentation und Abschlusspräsentation erstellen	04.08–16.09	M8

4 Meilensteine

Meilenstein	Beschreibung
M1	Projekt bestätigt und Projektumfang definiert
M2	Lastenheft, Pflichtenheft und Projektplan abgeschlossen; erste Version von Backend und Frontend erstellt
M3	Systemarchitektur und DISPO-Schnittstelle definiert; Backend-Grundstruktur implementiert
M4	Backend, Frontend und Workflow erweitert
M5	End-to-End-Prozess funktionsfähig
M6	Tests abgeschlossen und Fehler behoben
M7	Prototyp abgeschlossen
M8	Dokumentation und Abschlusspräsentation abgeschlossen

5 Zeitplan

Der Projektzeitplan orientiert sich an den definierten Projektphasen und Meilensteinen. Die einzelnen Phasen bauen aufeinander auf und führen schrittweise zur Fertigstellung des Prototyps sowie zur Abschlusspräsentation.

6 Systemarchitektur

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- Frontend (Web UI)
- Backend-Service
- Camunda Workflow Engine
- PostgreSQL Datenbank
- E-Mail Kommunikationsschnittstelle

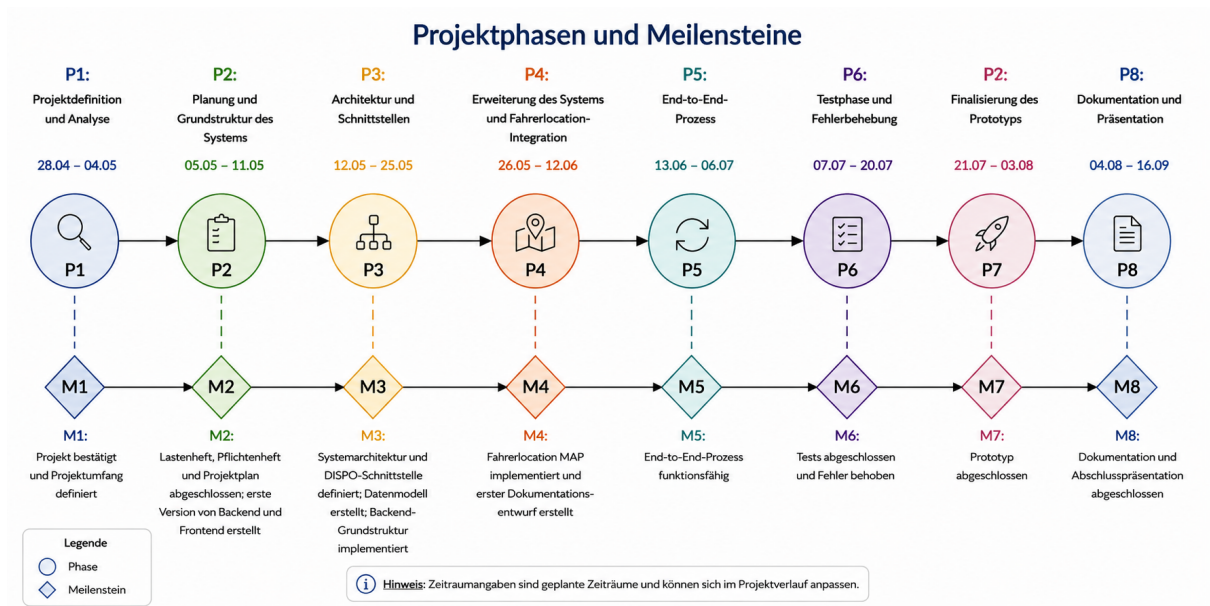


Abbildung 1: Projektphasen und Meilensteine

7 Technologien

- BPMN 2.0
- Camunda
- REST APIs
- PostgreSQL
- Java oder Node.js
- HTML/CSS/JavaScript

8 Rollen

- Disponent
- Kunde
- System

9 Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung der Qualität werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Funktionstests
- Integrationstests
- Prozesssimulationen
- Validierung der BPMN-Prozesse

- Fehleranalyse und Fehlerbehebung

10 Akzeptanzkriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn:

- Kundenreaktionen korrekt verarbeitet werden
- Statusänderungen nachvollziehbar gespeichert werden
- der End-to-End-Prozess funktionsfähig ist
- BPMN-Prozesse in Camunda erfolgreich ausgeführt werden
- Frontend und Backend korrekt kommunizieren

11 Erwartetes Ergebnis

Am Ende des Projekts soll ein funktionsfähiger Prototyp eines workflowbasierten Systems zur Rückbestätigung von Lieferterminen vorliegen.

Das System soll Kundenrückmeldungen strukturiert verarbeiten und bestätigte Aufträge transparent für die Disposition bereitstellen.
